

**Nombre PIP:** Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco, Ovalo Liberadores, Puente Costanera Nodo Versalles

**Informado al 30 de Agosto de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. **00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**


**Código SNIP** : 245953  
**Prod/Proy** : 2192979  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00011  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

**Fotos de acciones ejecutadas:**



Longitud total de vía Expresa en la ciudad

Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Ovalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,7 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

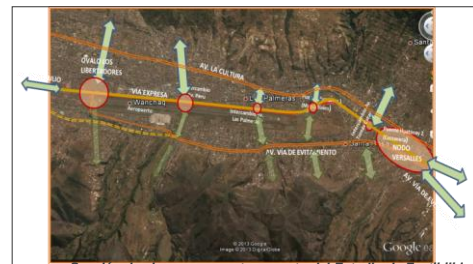

Sección de vía expresa: anteproyecto del Estudio de Factibilidad

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : **Av. Vía Expresa** Distrito : **Wanchaq, San Sebastian** Provincia : **Cusco**

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	347,244,873.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	3,593,408.36
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIM para el año 2017 :</b>	225,549,756
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b>	S/.	347,244,873.00	<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	221,576,879.80		
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	125,667,993.20		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	CONSORCIO CPS-COBA	JUN-JUL-2016
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Avance del Exp. Tecnico).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2015	0.00	0.00%	368,794.77	0.11%	346,876,078.23
02	A diciembre 2016	0.00	0.00%	3,224,613.59	0.93%	343,651,464.64
03	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	343,651,464.64
04	A febrero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	343,651,464.64
05	A marzo 2017	0.00	0.00%	699,820.00	0.20%	342,951,644.64
06	A abril 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342,951,644.64
07	A mayo 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342,951,644.64
08	A junio 2017	0.00	0.00%	23,769.00	0.01%	342,927,875.64
09	A julio 2017	0.00	0.00%	312,590.00	0.09%	342,615,285.64
10	A agosto 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342,615,285.64
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,629,587.36</b>	<b>1.33%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
229,143,164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	229,143,164.36

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION: (Exp. Tecnico)**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
240	22/04/2016	30/11/2016			0	240
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**  
 La empresa encargada de elaborar el Exp. Tecnico, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones del Exp. Tecnico con demora.

**Recomendaciones**  
 Se prevee tener Exp. Tecnico aprobado la quincena del mes de Agosto 2017, debido a que la empresa Consultora no cumple oportunamente en levantar observaciones. Se curso carta notarial para el cumplimiento de la entrega del Exp. Tecnico.

**Nombre PIP: Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Pisac distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento del Cusco**

**Informado al: 30 de AGOSTO de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 255602  
**Prod/Proy** : 2250007  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00006  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento acceso vehicular al S.A. Pumamarca (3.30 km)  
 Construcción del parador turístico en Pumamarca (200m2)  
 Implementación de señalización turística integral (30 unid.)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2510ml)  
 Restauración de andenerías en Pumamarca  
 Acciones de sensibilización e involucramiento  
 Acciones de capacitación y monitoreo a emprendedores  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac



**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado :	S/.	38,544,367.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado : S/.		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	31,907,199.60
Total Costos Indirectos:	S/.	6,637,167.40

Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	0.00
PIM para el año 2017 :	S/.	14,463,462.00
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2015		0.00%	846,517.00	2.65%	31,060,682.60
1	A diciembre 2016		0.00%	5,804.80	0.02%	31,054,877.80
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
6	A mayo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
7	A junio 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
8	A julio 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
8	A agosto 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>852,321.80</b>	<b>0.02%</b>	<b>31,054,877.80</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
14,463,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463,462.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Dias	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras
<b>Recomendaciones</b> Se remite documentación al Banco Mundial informando sobre problemas en el proceso de licitación de expediente tecnico

**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición final para el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba - Región Cusco .

**Informado al:** 30 de agosto de 2017.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237756  
**Prod/Proy** : 2197999  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2016** : 00003  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Jahuacollay Distrito : Urubamba Provincia : Urubamba

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	8,680,363.00	Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	69,616.76
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.		PIM para el año 2017		12,469,984.00
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.			Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	7,395,637.00			
Total Costos Indirectos:	S/.	1,284,726.00			

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	RES.DIR. 0325.DE.COPESCO/GRC	25/11/2016
Designación de Residente de obra	Memorándum	OBRA EJEC.POR CONTRATA	02/08/2017
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	69,616.76	0.94%	7,326,020.24
2	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
3	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
4	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.20%	7,310,920.24
5	A abril 2017		0.00%	221,500.00	3.00%	7,089,420.24
6	A mayo 2017		0.00%	9,741.00	0.13%	7,079,679.24
7	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,079,679.24
8	A julio 2017		0.00%	1,022,350.00	13.82%	6,057,329.24
9	A agosto 2017		0.00%	2,784,821.00	37.65%	3,272,508.24
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,123,128.76</b>	<b>55.75%</b>	<b>3,272,508.24</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
12,539,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,539,600.76

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
240	01/07/2017	30/03/2018			0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Esta pendiente la firma de contrato para su ejecución, se prevee el inicio para el mes de agosto
<b>Recomendaciones</b>

**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Taray y de la provincia de Calca- Región Cusco.

**Informado al:** 30 de agosto de 2017.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237591  
**Prod/Proy** : 2197998  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00002  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Yanahuaylla Distrito : Calca Provincia : Calca

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	6,611,849.00	Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	597,193.65
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.		PIM para el año 2017 :	S/.	5,649,461.00
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.			Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	5,924,822.00			
Total Costos Indirectos:	S/.	687,027.00			



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	CONSORCIO GEOCONSUL-GETINSA	30/06/2017
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Exp. Técnico)**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016		0.00%	597,193.65	10.08%	5,327,628.35
02	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
03	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
04	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.25%	5,312,528.35
05	A abril 2017		0.00%	177,400.00	2.99%	5,135,128.35
06	A mayo 2017		0.00%	149,541.00	2.52%	4,985,587.35
07	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,985,587.35
08	A julio 2017		0.00%	1,213,600.00	20.48%	3,771,987.35
09	A agosto 2017		0.00%	4,095.00	0.07%	3,767,892.35
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,156,929.65</b>	<b>36.40%</b>	<b>3,767,892.35</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
6,246,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246,654.65

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Dias	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
240	01/09/2017	30/05/2018			0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> El expediente tecnico se encuentra para registro de verificación de viabilidad y luego con informe para aprobacion de expediente
<b>Recomendaciones</b>  - Se recomienda agilizar el proceso de aprobacion de expediente.



**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro histórico v

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00014  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de implementado el Plan de Movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Cusco.

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	9,735,000.00	Ppto. ejecutado años anteriores :	741,464.22
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.		PIM para el año 2017 :	2,785,307
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:	S/.	9,735,000.00	Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)	0.00
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	7,982,700.00		
Total Costos Indirectos:	S/.	1,752,300.00		

**ESTADO**  
EN EJECUCION DE COMPONENTES



Plan de movilidad orientado al peatón

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016	0.00	0.00%	741,464.22	9.29%	7,241,235.78
02	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,241,235.78
03	A febrero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,241,235.78
04	A marzo 2017	0.00	0.00%	34,840.00	0.44%	7,206,395.78
05	A abril 2017	0.00	0.00%	8,500.00	0.11%	7,197,895.78
06	A mayo 2017	0.00	0.00%	48,325.00	0.61%	7,149,570.78
07	A junio 2017	0.00	0.00%	8,530.00	0.11%	7,141,040.78
08	A julio 2017	0.00	0.00%	4,400.11	0.06%	7,136,640.67
09	A agosto 2017	0.00	0.00%	12,030.00	0.15%	7,124,610.67
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>858,089.33</b>	<b>10.75%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
3,526,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,771.22

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Incumplimiento de plazos contractuales por parte de los consultores que genera retraso en la programación
<b>Recomendaciones</b> Monitoreo permanente hacia los consultores para el cumplimiento de lo establecido según cronograma

**Informado al: 30 de agosto de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro historico v

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00013  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer a la Gerencia de Infraestructura de la MP Cusco en temas de gestión vial, así como; fortalecer las capacidades del PROGRAMA METRA – COPESCO y de la MP Cusco.

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**ESTADO**

**Modalidad de Ejecución :**

**EN EJECUCION DE COMPONENTES**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	9,904,278.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :	S/.	9,904,278.00
Ppto. Total Costo Directo :	S/.	8,121,507.96
Total Costos Indirectos :	S/.	1,782,770.04

Ppto. ejecutado años anteriores :	0.00
PIM para el año 2017 :	2,776,926
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)	0.00

Plan de movilidad orientado al peatón



**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016	0.00	0.00%	1,593,608.75	19.62%	6,527,899.21
02	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,527,899.21
03	A febrero 2017	0.00	0.00%	8,809.12	0.11%	6,519,090.09
04	A marzo 2017	3.00	0.00%	332,009.57	4.09%	6,187,080.52
05	A abril 2017	0.00	0.00%	126,050.45	1.55%	6,061,030.07
06	A mayo 2017	0.00	0.00%	182,014.60	2.24%	5,879,015.47
07	A junio 2017	0.00	0.00%	204,171.05	2.51%	5,674,844.42
08	A julio 2017	0.00	0.00%	172,166.67	2.12%	5,502,677.75
09	A agosto 2017	0.00	0.00%	90,724.00	1.12%	5,411,953.75
<b>TOTAL</b>		<b>3.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,709,554.21</b>	<b>33.36%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
2,776,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,926.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.
<b>Recomendaciones</b> - Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicite oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00012  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer la capacidad de gestión e implementado el Plan Regulador del Transporte Público en la ciudad de Cusco. Fomentado el uso de bicicletas en la ciudad de Cusco.

Seguridad Vial en el centro historico



Plan de movilidad orientado al peatón

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

ESTADO

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

EN EJECUCION DE COMPONENTES

**Ubicación:**

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastij

Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	5,599,000.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :	S/.	5,599,000.00
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	4,591,180.00
Total Costos Indirectos:	S/.	1,007,820.00

Ppto. ejecutado años anteriores :	0.00	
PIM para el año 2017 :	S/.	2,292,896
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)	0.00	

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	316,701.03	6.90%	4,274,478.97
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	4,274,478.97
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	4,274,478.97
4	A marzo 2017		0.00%	20,000.00	0.00%	4,254,478.97
5	A abril 2017		0.00%	10,000.00	0.22%	4,244,478.97
6	A mayo 2017		0.00%	10,000.00	0.22%	4,234,478.97
7	A junio 2017		0.00%	10,000.00	0.22%	4,224,478.97
8	A julio 2017		0.00%	45,946.00	1.00%	4,178,532.97
9	A agosto 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,178,532.97
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>412,647.03</b>	<b>8.55%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
2,292,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,896.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b>
Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.
<b>Recomendaciones</b>

**Nombre FIP:** "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RÁPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO"

**Informado al: 30 de agosto 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. **00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2301167  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00025  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

**Modalidad de Ejecución :**

Concurso de Expediente Técnico

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : **PATACANCHA** Distrito : **OLLANTAYTAMBO** Provincia : **URUBAMBA**

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	4,662,794.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	0.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIA para el año 2017 :</b>	S/.
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</b>	S/.	4,662,794.00	<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00
<b>Ppto. Total Costo Directo :</b>	S/.	3,823,491.08		
<b>Total Costos Indirectos :</b>	S/.	839,302.92		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCION	DOCUMENTO	NUMERO	De FECHA
Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
2	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
3	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
4	A marzo 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
5	A abril 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
6	A mayo 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
7	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
8	A julio 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
8	A agosto 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
368,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,601.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones
Se encuentra en proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico
Recomendaciones
- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos para elaborar el Exp. Técnico.



**Nombre PIP: Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del monumento arqueológico de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.**

**Informado al: 30 de agosto de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:


**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

Código SNIP : 260407  
 Prod/Proy : 2250100  
 Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO  
 Meta SIAF del 2017 : 00008  
 Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písac (7.60 km)  
 Construcción Centro de Interpretación del P.A. Písac. (400m2)  
 Implementación de señalización turística integral (70 unid.)  
 Const. de parador turístico en sector de Qanturaqay (3100m2)  
 Acond. plaza artesanal, comercio artesanal y ss.hh. (1470m2)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2710ml)  
 Construcción de pasarela peatonal sobre el río Jatun Mayo  
 Reforzam. estructural y restauración de muros prehispánicos  
 Acciones de sensibilización con involucrados.  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fotos de acciones ejecutadas:

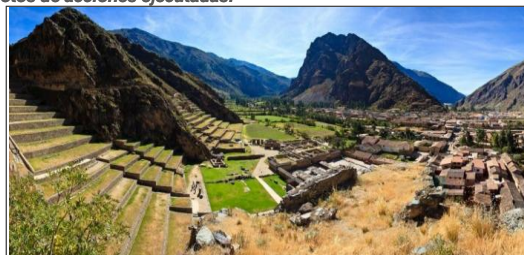

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**

**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písac

Localidad : Ollantaytambo

Distrito : Ollantaytambo

Provincia : Urubamba

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado :	S/.	4,939,020.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado : S/.		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	725,542.04
Total Costos Indirectos:	S/.	4,213,477.96

Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	44,622.40
PIM para el año 2017 :	S/.	2,581,635.00
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	44,622.40	6.15%	680,919.64
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
6	A mayo 2017		0.00%	16,586.00	2.29%	664,333.64
7	A junio 2017		0.00%	13,752.00	1.90%	650,581.64
8	A julio 2017		0.00%	0.00	0.00%	650,581.64
9	A agosto 2017		0.00%	12,874.00	1.77%	637,707.64
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>87,834.40</b>	<b>12.11%</b>	<b>637,707.64</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
2,626,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,257.40

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Se debe tener aprobado el expediente tecnico a finales del mes de setiembre

Recomendaciones

**Nombre PIP: Mejoramiento de servicios turísticos de observación del paisaje integral del Cusco - Circuito Valle Sagrado, distritos San Sebastián, Pisac y Huayllabamba, de Las Provincias Cusco, Calca y Urubamba, Departamento de Cusco**

**Informado al: 30 de agosto de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique  
 Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

**A.2 SUPERVISOR**  
 Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**  
 Código SNIP : 255893  
 Prod/Proy : 2250016  
 Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO  
 Meta SIAF del 2,017 : 00007  
 Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Corao  
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Pisac  
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Racchi  
 Acciones de sensibilización con involucrados  
 Acciones de promoción y difusión



Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

**Fuente de Financiamiento :**  
 Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**  
 Por contrato

**Ubicación:**  
 Localidad : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

**Distrito :** San Sebastián, Pisac y Huayllabamba. **Provincia :** Cusco Calca y Urubamba

<b>Presupuesto :</b>					
Ppto. Aprobado :	S/.	2,940,130.00	Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	0.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.		PIM para el año 2017 :	S/.	811,047.00
Ppto. Aprobado :	S/.		<small>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</small>		
Ppto. Total Costo Directo :	S/.	431,905.10			
Total Costos Indirectos :	S/.	2,508,224.90			

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	83,630.00	3.33%	348,275.10
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A mayo 2017		0.00%	18,500.00	0.74%	329,775.10
6	A junio 2017		0.00%	37,000.00	1.48%	292,775.10
7	A julio 2017		0.00%	0.00	0.00%	292,775.10
8	A agosto 2017		0.00%	12,941.00	0.52%	279,834.10
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>152,071.00</b>	<b>6.06%</b>	<b>279,834.10</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
811,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,047.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones  
 Se prevee tener el Exp. Tecnico aprobado a finales del mes de setiembre

Recomendaciones

**Nombre PIP:** "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA K'TAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO

**Informado al: 30 de agosto 2017**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2301167  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00026  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Concurso de Expediente Técnico**

**Ubicación:**

Localidad :

Distrito :

Provincia :

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	5,172,315.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	0.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIA para el año 2017 :</b>	S/.
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</b>	S/.	5,172,315.00		708,831
<b>Ppto. Total Costo Directo :</b>	S/.	4,241,298.30	<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00
<b>Total Costos Indirectos :</b>	S/.	931,016.70		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCION	DOCUMENTO	NUMERO	De FECHA
Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
2	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
3	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
4	A marzo 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
5	A abril 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
6	A mayo 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
7	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
8	A julio 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
9	A agosto 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
708,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,831.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Se encuentra en proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición para elaborar el Exp. Técnico.

**Nombre Programa:** "Consolidación y diversificación del producto turístico Cusco - Valle Sagrado de los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la

**Informado al: 30 de agosto 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : N° **00/00**

Fotos de acciones



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2311404  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00009  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Consolidación de los recursos turísticos

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) es una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional del Cusco, es decir el PER Plan COPESCO, responsable de conducir y coordinar la implementación y administración del Programa de Inversión "Consolidación y diversificación del producto turístico Cusco - Valle Sagrado de los Incas entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región del Cusco", para lo cual cuenta con la autonomía técnica y financiera.

**Fuente de Financiamiento :**  
 Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

<b>ESTADO</b>
<b>Concurso de Expediente Técnico</b>

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

Valle Sagrado de los Incas



**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	18,743,510.23	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	0.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.	<b>PIA para el año 2017 :</b>	S/ 18,548,015
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b>	18,743,510.23	<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/ 15,369,678.39		
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/ 3,373,831.84		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	1,502,149.50	9.77%	13,867,528.89
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	13,867,528.89
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	13,867,528.89
4	A marzo 2017	3.00	0.00%	354,211.00	2.30%	13,513,317.89
5	A abril 2017	3.00	0.00%	94,696.00	0.62%	13,418,621.89
6	A mayo 2017	3.00	0.00%	324,833.50	2.11%	13,093,788.39
7	A junio 2017	3.00	0.00%	184,387.00	1.20%	12,909,401.39
8	A julio 2017	3.00	0.00%	173,327.00	1.13%	12,736,074.39
9	A agosto 2017	3.00	0.00%	5,806.00	0.04%	12,730,268.39
<b>TOTAL</b>		<b>18.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,639,410.00</b>	<b>17.17%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	idades Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
18,548,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,548,015.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
TIEMPO EJECUCION						

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.
<b>Recomendaciones</b> - Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.
