

**Nombre PIP:** Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco, Ovalo Liberadores, Puente Costanera Nodo Versalles

**Informado al:** 30 de mayo de 2017.

**A.1 COORDINADOR GRAL** Econ. Yenesi Ojeda Alvarez  
 Último Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. **00/00**

**A.2 SUPERVISOR**  
 Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**  
**Código SNIP** : 245953  
**Prod/Proy** : 2192979  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00011  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

**Fotos de acciones ejecutadas:**

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- CONTRATO: 2 B06
- MODALIDAD VIAL: 4 ENDS POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN
- NÚMERO DE CARRILES: 2 POR CADA VÍA
- SEPARACIÓN CENTRAL: 8.00 M. VÍA TRONCAL, 3.00 M. VÍA SECUNDARIA
- SEPARACIÓN LATERAL: 2.00 M. (LADO DERECHO DE VÍA PRINCIPAL)
- SEPARACIÓN LATERAL: 2.00 M. (LADO IZQUIERDA DE VÍA PRINCIPAL)
- SEÑALIZACIÓN: 180 M. EN VÍAS CENTRALES (OVIALO LOS LIBERTADORES)
- SEÑALIZACIÓN: 4 ENDS LIBERTADORES, 800 M. EN VÍA CENTRAL
- TIPO DE TERRENO: 1 GENERALIZADO CON VÍA DE ENTUBAMIENTOS
- TIPO DE CARRILAS: 2 B06 UNIDIRECCIONAL
- TIPO DE PAVIMENTO: 4
- ACCIONES Y METAS: 64

**DISEÑO GEOMÉTRICO - SECCIÓN TÍPICA**

Longitud total de vía Expresa en la ciudad


Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Ovalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,7 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

**Fuente de Financiamiento :**  
 Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**Modalidad de Ejecución :**  
 Por contrato

**Ubicación:**

<b>ESTADO</b>
Concurso de Expediente Técnico

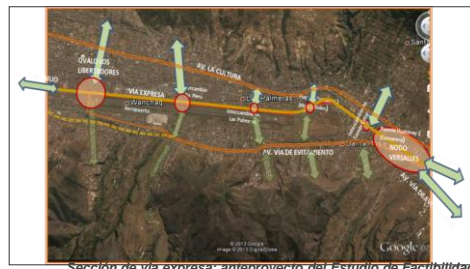

Localidad : Av. Vía Expresa      Distrito : Wanchaq, San Sebastian      Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	347,244,873.00	Ppto. ejecutado años anteriores :	3,593,408.36
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.		PIA para el año 2017 :	264,901,324.00
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:	S/.	347,244,873.00	Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)	0.00
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	221,576,879.80		
Total Costos Indirectos:	S/.	125,667,993.20		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2015	0.00	0.00%	368,794.77	0.11%	346,876,078.23
02	A diciembre 2016	0.00	0.00%	3,224,613.59	0.93%	343,651,464.64
03	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	343,651,464.64
04	A febrero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	343,651,464.64
05	A marzo 2017	0.00	0.00%	699,820.00	0.20%	342,951,644.64
06	A abril 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342,951,644.64
07	A mayo 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342,951,644.64
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,293,228.36</b>	<b>1.24%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
268,494,732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	268,494,732.36

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**  
 Al final del III trimestre 2017 se viene levantando observaciones realizadas al Exp. Técnico .

**Recomendaciones**  
 Se prevee tener Exp. Técnico aprobado la quincena del mes de mayo 2017

**Nombre PIP: Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Písaq distrito de Písaq, provincia de Calca, departamento del Cusco**

**Informado al: 30 de mayo de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GENERAL :** Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento de Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Písaq

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP :** 255602  
**Prod/Proy :** 2250007  
**Unidad Ejecutora :** PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017 :** 00006  
**Meta Física (resumen) :** Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento acceso vehicular al S.A. Pumamarca (3.30 km)  
 Construcción del parador turístico en Pumamarca (200m2)  
 Implementación de señalización turística integral (30 unid.)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2510ml)  
 Restauración de andenerías en Pumamarca  
 Acciones de sensibilización e involucramiento  
 Acciones de capacitación y monitoreo a emprendedores  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písaq



**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado :	S/.	38,544,367.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado : S/.		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	31,907,199.60
Total Costos Indirectos:	S/.	6,637,167.40

Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	0.00
PIM para el año 2017 :	S/.	20,740,867.00
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2015		0.00%	846,517.00	2.65%	31,060,682.60
1	A diciembre 2016		0.00%	5,804.80	0.02%	31,054,877.80
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
6	A mayo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>852,321.80</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	<b>TOTAL MODIF.</b>
20,740,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740,867.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**  
 Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras

**Recomendaciones**  
 Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición final para el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba - Región Cusco .

**Informado al:** 30 de mayo de 2017.

**A.1 COORDINADOR GENERAL :** Econ Yenesi Ojeda Alvarez.

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237756  
**Prod/Proy** : 2197999  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2016** : 00003  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

**Localidad :** Jahuacollay **Distrito :** Urubamba **Provincia :** Urubamba

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	8,680,363.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	S/.	69,616.76
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIM para el año 2017</b>		13,009,984.00
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b>	S/.		<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>		
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	7,395,637.00			
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	1,284,726.00			

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	69,616.76	0.94%	7,326,020.24
2	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
3	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
4	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.20%	7,310,920.24
5	A abril 2017		0.00%	221,500.00	3.00%	7,089,420.24
6	A mayo 2017		0.00%	9,741.00	0.13%	7,079,679.24
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>315,957.76</b>	<b>4.27%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
13,079,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079,600.76

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b> Se observa un riesgo medio latente de que uno o varios de estos procesos de caigan o declaren desierto por falta de postores; especialmente en el caso de compactadores y consultorías por el nivel de especialización
<b>Recomendaciones</b> - Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de

**Nombre PIP:** Ampliación y Mejoramiento del Sistema de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Provincia de Cusco - Región Cusco.

**Informado al:** 30 de mayo de 2017.

**A.1 COORDINADOR GENERAL :** Econ Yenesi Alvarez O.  
 Último Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:

**A.2 SUPERVISOR**  
 Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**



Viaje de Pasantía

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**  
**Código SNIP :** 235236  
**Prod/Proy :** 2197984  
**Unidad Ejecutora :** PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2,016 :** 00001  
**Meta Física (resumen) :** Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

**Fuente de Financiamiento :**  
 Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**  
 Por contrato



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**Ubicación:**  
 Localidad :  Distrito :  Provincia :

**Presupuesto :**  
**Ppto. Aprobado :** S/.   
**Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :** S/.   
**Ppto. Aprobado :** S/.   
**Ppto. Total Costo Directo:** S/.   
**Total Costos Indirectos:** S/.   
**Ppto. ejecutado años anteriores :** S/.   
**PIM para el año 2016 :** S/.   
 Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01			0.00%		0.00%	32,918,239.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gov. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
17,781,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,781,820.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones  
 No tenemos delegación de competencias efectuadas por el organo sub nacional competente en materia de Residuos Sólidos (Municipalidad Provincial del Cusco)

Recomendaciones  
 Mantener el PIP mientras se cuente con el acuerdo entre el Banco Mundial y el Gobierno de Peru respecto a la ejecución del proyecto.

**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Taray de la provincia de Calca- Región Cusco.

**Informado al:** 30 de mayo de 2017.

**A.1 COORDINADOR GENERAL :** Econ Yenesi Ojeda Alvarez.

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237591  
**Prod/Proy** : 2197998  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00002  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha: 24 al 27 noviembre 2015

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Yanahuaylla

Distrito : Calca

Provincia : Calca

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	6,611,849.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	S/.	597,193.65
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIM para el año 2017 :</b>	S/.	5,671,403.00
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b>	S/.		<i>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</i>		
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	5,924,822.00			
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	687,027.00			

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016		0.00%	597,193.65	10.08%	5,327,628.35
02	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
03	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
04	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.25%	5,312,528.35
05	A abril 2017		0.00%	177,400.00	2.99%	5,135,128.35
05	A mayo 2017		0.00%	149,541.00	2.52%	4,985,587.35
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>939,234.65</b>	<b>15.85%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
6,268,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,596.65

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

El expediente tecnico se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisicion solicitados.

**Nombre PIP:** "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RÁPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURÍSTICO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO"

**Informado al: 30 de mayo 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL** Econ. Yenesi Ojeda Alvarez  
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro. 00/00

*Fotos de acciones ejecutadas:*



**A.2 SUPERVISOR**  
Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: 00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**  
**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2301167  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00025  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad medición y control situaciones de emergencia Ollantaytambo ante el riesgo a inundaciones

**Modalidad de Ejecución :** Concurso de Expediente Técnico

**Ubicación:**  
 Localidad : PATACANCHA Distrito : OLLANTAYTAMBO Provincia : URUBAMBA

Presupuesto :				
<i>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</i>	S/.	4,662,794.00	<i>Ppto. ejecutado años anteriores :</i>	0.00
<i>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</i>	S/.		<i>PIA para el año 2017 :</i>	368,601
<i>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</i>	S/.	4,662,794.00	<i>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</i>	0.00
<i>Ppto. Total Costo Directo :</i>	S/.	3,823,491.08		
<i>Total Costos Indirectos :</i>	S/.	839,302.92		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCION	DOCUMENTO	NUMERO	De FECHA
Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	3,823,491.08
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	3,823,491.08
4	A marzo 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
5	A abril 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
6	A mayo 2017		0.00%	0.00	0.00%	3,823,491.08
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gov. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
368,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,601.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<p><b>Limitaciones</b></p> <p>Se espera la No Objecion del Banco Mundial de los TDR para el lanzamiento para elaboracion de Expediente Tecnico</p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos para elaborar el Exp. Tecnico.</p>
---

**Nombre PIP: Mejoramiento de servicios turísticos de observación del paisaje Integral del Cusco - Circuito Valle Sagrado, distritos San Sebastián, Pisac y Huayllabamba, de Las Provincias Cusco, Calca y Urubamba, Departamento de Cusco**

**Informado al: 30 de mayo de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GENERAL :** Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP :** 255893  
**Prod/Proy :** 2250016  
**Unidad Ejecutora :** PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2,017 :** 00007  
**Meta Física (resumen) :** Descripción de los Componentes del Proyecto;

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Corao  
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Pisac  
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Racchi  
 Acciones de sensibilización con involucrados  
 Acciones de promoción y difusión

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Distrito : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Provincia : Cusco Calca y Urubamba

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado :</b>	S/.	2,940,130.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.	
<b>Ppto. Aprobado : S/.</b>		
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	431,905.10
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	2,508,224.90

<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	S/.	0.00
<b>PIM para el año 2017 :</b>	S/.	1,453,790.00
<small>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</small>		

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac



**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	83,630.00	3.33%	348,275.10
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A mayo 2017		0.00%	18,500.00	0.00%	329,775.10
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>102,130.00</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
1,453,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,790.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**

Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras  
 Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

**Recomendaciones**

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura



**Nombre PIP: Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del monumento arqueológico de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.**

**Informado al: 30 de mayo de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GENERAL** : Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 260407  
**Prod/Proy** : 2250100  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00008  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písaq (7.60 km)  
 Construcción Centro de Interpretación del P.A. Písaq. (400m2)  
 Implementación de señalización turística integral (70 unid.)  
 Const. de parador turístico en sector de Qanturaqay (3100m2)  
 Acond. plaza artesanal, comercio artesanal y ss.hh. (1470m2)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2710ml)  
 Construcción de pasarela peatonal sobre el río Jatun Mayo  
 Reforzam. estructural y restauración de muros prehispánicos  
 Acciones de sensibilización con involucrados.  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Ollantaytambo

Distrito : Ollantaytambo

Provincia : Urubamba

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písaq



**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado :	S/.	4,939,020.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado : S/.		
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	725,542.04
Total Costos Indirectos:	S/.	4,213,477.96

Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	44,622.40
PIM para el año 2017 :	S/.	3,541,624.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	44,622.40	6.15%	680,919.64
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
6	A mayo 2017		0.00%	16,586.00	0.00%	664,333.64
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>61,208.40</b>	<b>6.15%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
3,586,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,246.40

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras  
 Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

Recomendaciones

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

**A.1 COORDINADOR GRAL**

Econ. Yenesi Ojeda Alvarez

Fotos de acciones ejecutadas:

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00014  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;



Seguridad Vial en el centro histórico v

El objetivo de este componente es de implementado el Plan de Movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Cusco.



Plan de movilidad orientado al peatón

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**ESTADO**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**EN EJECUCION DE COMPONENTES**

**Ubicación:**

Localidad :

Cusco

Distrito :

Cusco, Wanchaq, San Sebastian

Provincia :

Cusco

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	9,735,000.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.	
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b>	S/.	9,735,000.00
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	7,982,700.00
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	1,752,300.00

<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	741,464.22
<b>PIA para el año 2016 :</b>	3,335,307
<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016	0.00	0.00%	741,464.22	9.29%	7,241,235.78
02	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,241,235.78
03	A febrero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,241,235.78
04	A marzo 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,241,235.78
05	A abril 2017	0.00	0.00%	43,340.00	0.54%	7,197,895.78
06	A mayo 2017	0.00	0.00%	48,325.00	0.61%	7,149,570.78
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>833,129.22</b>	<b>10.44%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

<b>Aporte Gob. Regional</b>	<b>Otros Aportes</b>	<b>Mayores Metrados</b>	<b>Partidas Nuevas / Adicionales</b>	<b>Deductivos</b>	<b>TOTAL MODIF.</b>
4,076,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,771.22

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**

Incumplimiento de plazos contractuales por parte de los consultores que genera retraso en la programación

**Recomendaciones**

Monitoreo permanente hacia los consultores para el cumplimiento de lo establecido según cronograma

**A.1 COORDINADOR GRAL**

Econ. Yenesi Ojeda Alvarez

Fotos de acciones ejecutadas:

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00013  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;



Seguridad Vial en el centro historico v

El objetivo de este componente es de fortalecer a la Gerencia de Infraestructura de la MP Cusco en temas de gestión vial, así como; fortalecer las capacidades del PROGRAMA METRA – COPESCO y de la MP Cusco.



Plan de movilidad orientado al peaton

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**ESTADO**

**Modalidad de Ejecución :**

**EN EJECUCION DE COMPONENTES**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :

Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :	S/.	9,904,278.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:	S/.	9,904,278.00
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	8,121,507.96
Total Costos Indirectos:	S/.	1,782,770.04

Ppto. ejecutado años anteriores :	0.00
PIA para el año 2017 :	4,110,099
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)	0.00

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016	0.00	0.00%	1,593,608.75	19.62%	6,527,899.21
02	A enero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,527,899.21
03	A febrero 2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,527,899.21
04	A marzo 2017	3.00	0.00%	395,659.00	4.87%	6,132,240.21
05	A abril 2017	0.00	0.00%	71,528.00	0.88%	6,060,712.21
05	A abril 2017	0.00	0.00%	179,563.39	2.21%	5,881,148.82
<b>TOTAL</b>		<b>3.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,240,359.14</b>	<b>27.59%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
4,110,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,099.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

**A.1 COORDINADOR GRAL** Econ. Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00012  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer la capacidad de gestión e implementado el Plan Regulador del Transporte Público en la ciudad de Cusco. Fomentado el uso de bicicletas en la ciudad de Cusco.

Seguridad Vial en el centro historico



**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**ESTADO**  
**EN EJECUCION DE COMPONENTES**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :

Distrito :

Provincia :

Plan de movilidad orientado al peatón

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	5,599,000.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.	
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</b>	S/.	5,599,000.00
<b>Ppto. Total Costo Directo:</b>	S/.	4,591,180.00
<b>Total Costos Indirectos:</b>	S/.	1,007,820.00

<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	0.00	
<b>PIA para el año 2017 :</b>	S/.	2,384,751
<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00	

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	316,701.03	6.90%	4,274,478.97
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	4,274,478.97
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	4,274,478.97
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	4,274,478.97
5	A abril 2017		0.00%	30,000.00	0.65%	4,244,478.97
6	A mayo 2017		0.00%	48,305.00	1.05%	4,196,173.97
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>395,006.03</b>	<b>8.60%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

<b>Aporte Gob. Regional</b>	<b>Otros Aportes</b>	<b>Mayores Metrados</b>	<b>Partidas Nuevas / Adicionales</b>	<b>Deductivos</b>	<b>TOTAL MODIF.</b>
2,384,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,751.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

<b>Limitaciones</b>
Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.
<b>Recomendaciones</b>
- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

**Nombre PIP:** CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA K'TAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO

**Informado al: 30 de mayo 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL** Econ. Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2301167  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00026  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

Concurso de Expediente Técnico

**Ubicación:**

Localidad : KITAMAYU

Distrito : PISAC

Provincia : CALCA

**Presupuesto :**

<b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>	S/.	5,172,315.00	<b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>	0.00
<b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>	S/.		<b>PIA para el año 2017 :</b>	708,831
<b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</b>	S/.	5,172,315.00	<b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b>	0.00
<b>Ppto. Total Costo Directo :</b>	S/.	4,241,298.30		
<b>Total Costos Indirectos :</b>	S/.	931,016.70		

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCION	DOCUMENTO	NUMERO	De FECHA
Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	4,241,298.30
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	4,241,298.30
4	A marzo 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
5	A abril 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
6	A mayo 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,241,298.30
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
708,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,831.00

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**

Se espera la No Objeción del Banco Mundial de los TDR para el lanzamiento para elaboración de Expediente Técnico

**Recomendaciones**

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición para elaborar el Exp. Técnico.

