

Nombre PIP: Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco, Ovalo Liberadores, Puente Costanera Nodo Versalles

Informado al: 30 de SETIEMBRE de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :


Código SNIP : 245953
Prod/Proy : 2192979
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00011
Meta Fisica (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



Longitud total de vía Expresa en la ciudad

Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Ovalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,7 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

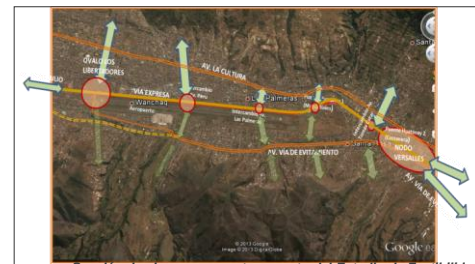

Sección de vía expresa: anteproyecto del Estudio de Factibilidad

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Av. Vía Expresa

Distrito : Wanchaq, San Sebastian

Provincia : Cusco

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/. 347,244,873.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/. 347,244,873.00

Ppto. Total Costo Directo: S/. 221,576,879.80

Total Costos Indirectos: S/. 125,667,993.20

Ppto. ejecutado años anteriores :

3,593,408.36

PIM para el año 2017 : S/.

225,549,756

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

0.00

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Aprobación Expediente | Resolución | CONSORCIO CPS-COBA | JUN-JUL-2016 |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Avance del Exp. Técnico).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 01 | A diciembre 2015 | 0.00 | 0.00% | 368,794.77 | 0.11% | 346,876,078.23 |
| 02 | A diciembre 2016 | 0.00 | 0.00% | 3,224,613.59 | 0.93% | 343,651,464.64 |
| 03 | A enero 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 343,651,464.64 |
| 04 | A febrero 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 343,651,464.64 |
| 05 | A marzo 2017 | 0.00 | 0.00% | 699,820.00 | 0.20% | 342,951,644.64 |
| 06 | A abril 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 342,951,644.64 |
| 07 | A mayo 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 342,951,644.64 |
| 08 | A junio 2017 | 0.00 | 0.00% | 23,769.00 | 0.01% | 342,927,875.64 |
| 09 | A julio 2017 | 0.00 | 0.00% | 312,590.00 | 0.09% | 342,615,285.64 |
| 10 | A agosto 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 342,615,285.64 |
| 11 | A setiembre 2017 | 0.00 | 0.00% | 902,178.00 | 0.26% | 341,713,107.64 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 5,531,765.36 | 1.59% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 229,143,164.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,143,164.36 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION: (Exp. Técnico)

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240 | 22/04/2016 | 30/11/2016 | | | 0 | 240 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|---|
| Limitaciones El Exp. Técnico se encuentra aprobado por la Empresa Supervisora aun falta los estudios de interferencias. |
| Recomendaciones Se prevee tener Exp. Técnico aprobado la quincena del mes de octubre 2017. |

Nombre PIP: Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Písaq distrito de Písaq, provincia de Calca, departamento del Cusco

Informado al: 30 de Setiembre de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Último Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Písaq

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 255602
Prod/Proy : 2250007
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00006
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento acceso vehicular al S.A. Pumamarca (3.30 km)
 Construcción del parador turístico en Pumamarca (200m2)
 Implementación de señalización turística integral (30 unid.)
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2510ml)
 Restauración de andenerías en Pumamarca
 Acciones de sensibilización e involucramiento
 Acciones de capacitación y monitoreo a emprendedores
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO
Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Distrito : Provincia :

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písaq



Presupuesto :

| | | |
|--|-----|---------------|
| Ppto. Aprobado : | S/. | 38,544,367.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado : | S/. | |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/. | 31,907,199.60 |
| Total Costos Indirectos: | S/. | 6,637,167.40 |

| | | |
|--|-----|---------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | S/. | 0.00 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 14,463,462.00 |
| <small>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</small> | | |

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2015 | | 0.00% | 846,517.00 | 2.65% | 31,060,682.60 |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 5,804.80 | 0.02% | 31,054,877.80 |
| 1 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 278,279.00 | 0.87% | 30,776,598.80 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 1,130,600.80 | 0.89% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
| 14,463,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,463,462.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras

Recomendaciones

Se remito documntacion al Banco Mundial informando sobre problemas en el proceso de licitacion de expediente tecnico

Nombre PIP: Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición final para el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba - Región Cusco .

Informado al: 30 de setiembre de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 237756
Prod/Proy : 2197999
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2016 : 00003
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS
 Apropiada disposición final de los RRSS
 Eficiente gestión administrativa y financiera
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Jahuacollay

Distrito : Urubamba

Provincia : Urubamba

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/. 8,680,363.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.
Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.
Ppto. Total Costo Directo: S/. 7,395,637.00
Total Costos Indirectos: S/. 1,284,726.00

Ppto. ejecutado años anteriores : S/. 69,616.76
PIM para el año 2017 12,469,984.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Aprobación Expediente | Resolución | RES.DIR. 0325.DE.COPESCO/GRC | 25/11/2016 |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | OBRA EJEC.POR CONTRATA | 02/08/2017 |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 69,616.76 | 0.94% | 7,326,020.24 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,326,020.24 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,326,020.24 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | 15,100.00 | 0.20% | 7,310,920.24 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | 221,500.00 | 3.00% | 7,089,420.24 |
| 6 | A mayo 2017 | | 0.00% | 9,741.00 | 0.13% | 7,079,679.24 |
| 7 | A junio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,079,679.24 |
| 8 | A julio 2017 | | 0.00% | 1,022,350.00 | 13.82% | 6,057,329.24 |
| 9 | A agosto 2017 | | 0.00% | 2,786,821.00 | 37.68% | 3,270,508.24 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 333,750.00 | 4.51% | 2,936,758.24 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 4,125,128.76 | 55.78% | 3,270,508.24 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 12,539,600.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,539,600.76 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240 | 01/07/2017 | 30/03/2018 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|---|
| Limitaciones Se firmo contrato para ejecución de PIP en el mes de agosto, se procedio con el primer pago. |
| Recomendaciones |

Nombre PIP: Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Taray de la provincia de Calca- Región Cusco.

Informado al: 30 de setiembre de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 237591
Prod/Proy : 2197998
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00002
Meta Fisica (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS
 Apropiada disposición final de los RRSS
 Eficiente gestión administrativa y financiera
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Yanahuaylla

Distrito : Calca

Provincia : Calca

Presupuesto :

| | | |
|--|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : | S/. | 6,611,849.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/. | | |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/. | 5,924,822.00 |
| Total Costos Indirectos: | S/. | 687,027.00 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | S/. | 597,193.65 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 5,649,461.00 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | | |

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Aprobación Expediente | Resolución | CONSORCIO GEOCONSUL-GETINSA | 30/06/2017 |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Exp. Tecnico)

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 01 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 597,193.65 | 10.08% | 5,327,628.35 |
| 02 | A enero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 5,327,628.35 |
| 03 | A febrero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 5,327,628.35 |
| 04 | A marzo 2017 | | 0.00% | 15,100.00 | 0.25% | 5,312,528.35 |
| 05 | A abril 2017 | | 0.00% | 177,400.00 | 2.99% | 5,135,128.35 |
| 06 | A mayo 2017 | | 0.00% | 149,541.00 | 2.52% | 4,985,587.35 |
| 07 | A junio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,985,587.35 |
| 08 | A julio 2017 | | 0.00% | 1,213,600.00 | 20.48% | 3,771,987.35 |
| 09 | A agosto 2017 | | 0.00% | 4,095.00 | 0.07% | 4,981,492.35 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 472,200.00 | 7.97% | 3,299,787.35 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 2,629,129.65 | 44.37% | 3,299,787.35 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 6,246,654.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,246,654.65 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Dias | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240 | 01/09/2017 | 30/05/2018 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|---|
| <p>Limitaciones El expediente tecnico se encuentra en proceso de aprobacion para proceder a la convocatoria a ejecucion de obras.</p> <p>Recomendaciones - Se recomienda agilizar el proceso de aprobacion de expediente.</p> |
|---|

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro historico v

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2013-SNIP
 Prod/Proy : 2309562
 Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
 Meta SIAF del 2017 : 00014
 Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de implementado el Plan de Movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Cusco.

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

ESTADO

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

EN EJECUCION DE COMPONENTES

Ubicación:

Localidad :

Cusco

Distrito :

Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia :

Cusco

Presupuesto :

| | | |
|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : | S/. | 9,735,000.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado : | S/. | 9,735,000.00 |
| Ppto. Total Costo Directo : | S/. | 7,982,700.00 |
| Total Costos Indirectos : | S/. | 1,752,300.00 |

| | |
|---|------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | 741,464.22 |
| PIM para el año 2017 : | 2,785,307 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | 0.00 |

Plan de movilidad orientado al peaton



A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 01 | A diciembre 2016 | 0.00 | 0.00% | 741,464.22 | 9.29% | 7,241,235.78 |
| 02 | A enero 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,241,235.78 |
| 03 | A febrero 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,241,235.78 |
| 04 | A marzo 2017 | 0.00 | 0.00% | 34,840.00 | 0.44% | 7,206,395.78 |
| 05 | A abril 2017 | 0.00 | 0.00% | 8,500.00 | 0.11% | 7,197,895.78 |
| 06 | A mayo 2017 | 0.00 | 0.00% | 48,325.00 | 0.61% | 7,149,570.78 |
| 07 | A junio 2017 | 0.00 | 0.00% | 8,530.00 | 0.11% | 7,141,040.78 |
| 08 | A julio 2017 | 0.00 | 0.00% | 4,400.11 | 0.06% | 7,136,640.67 |
| 09 | A agosto 2017 | 0.00 | 0.00% | 12,030.00 | 0.15% | 7,124,610.67 |
| 10 | A setiembre 2017 | 0.00 | 0.00% | 24,442.00 | 0.31% | 7,100,168.67 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 882,531.33 | 11.06% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 3,526,771.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526,771.22 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Incumplimiento de plazos contractuales por parte de los consultores que genera retraso en la programación

Recomendaciones

Monitoreo permanente hacia los consultores para el cumplimiento de lo establecido según cronograma

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro historico v

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2013-SNIP
Prod/Proy : 2309562
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00013
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer a la Gerencia de Infraestructura de la MP Cusco en temas de gestión vial, así como; fortalecer las capacidades del PROGRAMA METRA – COPESCO y de la MP Cusco.

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia : Cusco

Presupuesto :

| | | |
|--|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : | S/. | 9,904,278.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado : | S/. | 9,904,278.00 |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/. | 8,121,507.96 |
| Total Costos Indirectos: | S/. | 1,782,770.04 |



Plan de movilidad orientado al peatón

| | | |
|--|-----|-----------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | | 0.00 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 2,776,926 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | | 0.00 |

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 01 | A diciembre 2016 | 0.00 | 0.00% | 1,593,608.75 | 19.62% | 6,527,899.21 |
| 02 | A enero 2017 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 6,527,899.21 |
| 03 | A febrero 2017 | 0.00 | 0.00% | 8,809.12 | 0.11% | 6,519,090.09 |
| 04 | A marzo 2017 | 3.00 | 0.00% | 332,009.57 | 4.09% | 6,187,080.52 |
| 05 | A abril 2017 | 0.00 | 0.00% | 126,050.45 | 1.55% | 6,061,030.07 |
| 06 | A mayo 2017 | 0.00 | 0.00% | 182,014.60 | 2.24% | 5,879,015.47 |
| 07 | A junio 2017 | 0.00 | 0.00% | 204,171.05 | 2.51% | 5,674,844.42 |
| 08 | A julio 2017 | 0.00 | 0.00% | 172,166.67 | 2.12% | 5,502,677.75 |
| 09 | A agosto 2017 | 0.00 | 0.00% | 90,724.00 | 1.12% | 5,411,953.75 |
| 10 | A setiembre 2017 | 0.00 | 0.00% | 328,711.00 | 4.05% | 5,083,242.75 |
| TOTAL | | 3.00 | 0.00% | 3,038,265.21 | 37.41% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 2,776,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,776,926.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Dias | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2013-SNIP
Prod/Proy : 2309562
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00012
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer la capacidad de gestión e implementado el Plan Regulador del Transporte Público en la ciudad de Cusco. Fomentado el uso de bicicletas en la ciudad de Cusco.

Seguridad Vial en el centro historico



Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

ESTADO

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

EN EJECUCION DE COMPONENTES

Ubicación:

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastij

Plan de movilidad orientado al peatón

Provincia : Cusco

Presupuesto :

| | | |
|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : | S/. | 5,599,000.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado : | S/. | 5,599,000.00 |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/. | 4,591,180.00 |
| Total Costos Indirectos: | S/. | 1,007,820.00 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | | 0.00 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 2,292,896 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | | 0.00 |

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 316,701.03 | 6.90% | 4,274,478.97 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 4,274,478.97 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 4,274,478.97 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | 20,000.00 | 0.00% | 4,254,478.97 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | 10,000.00 | 0.22% | 4,244,478.97 |
| 6 | A mayo 2017 | | 0.00% | 10,000.00 | 0.22% | 4,234,478.97 |
| 7 | A junio 2017 | | 0.00% | 10,000.00 | 0.22% | 4,224,478.97 |
| 8 | A julio 2017 | | 0.00% | 45,946.00 | 1.00% | 4,178,532.97 |
| 9 | A agosto 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,178,532.97 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 20,000.00 | 0.44% | 4,158,532.97 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 432,647.03 | 8.99% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 2,292,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,292,896.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|---|
| <u>Limitaciones</u> |
| Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras. |
| <u>Recomendaciones</u> |

Nombre PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RÁPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURÍSTICO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO"

Informado al: 30 de setiembre 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2012-SNIP

Prod/Proy : 2301167

Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO

Meta SIAF del 2017 : 00025

Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

Modalidad de Ejecución :

Concurso de Expediente Técnico

Por contrato

Ubicación:

Localidad : **PATACANCHA**

Distrito : **OLLANTAYTAMBO**

Provincia : **URUBAMBA**

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/.

4,662,794.00

Ppto. ejecutado años anteriores :

0.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

4,662,794.00

PIA para el año 2017 : S/.

368,601

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado : S/.

4,662,794.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

0.00

Ppto. Total Costo Directo : S/.

3,823,491.08

Total Costos Indirectos : S/.

839,302.92

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| DESCRIPCION | DOCUMENTO | NUMERO | De FECHA |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Aprobación Expediente | Resolución | | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 6 | A mayo 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 7 | A junio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 8 | A julio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 9 | A agosto 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,823,491.08 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 368,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,601.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Dias | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

No existen empresas especializadas en SAT/ Riesgos

Recomendaciones

- Profundizar el diagnóstico de empresas y ONG con potencial en ingeniería y tecnológico para realizar el Exp. Definitivo

- Hacer el seguimiento telefónico de las invitaciones directas realizadas vía correo electrónico al constatar errores en la transmisión y recepción de los correos electrónicos

Nombre PIP: Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del monumento arqueológico de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.


Informado al: 30 de setiembre de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:

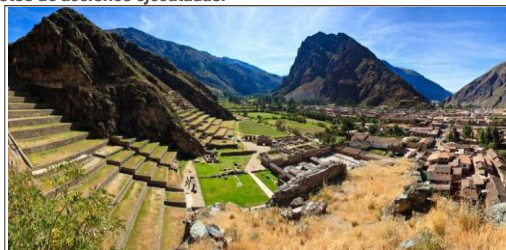

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 260407
Prod/Proy : 2250100
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00008
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písac (7.60 km)
 Construcción Centro de Interpretación del P.A. Písac. (400m2)
 Implementación de señalización turística integral (70 unid.)
 Const. de parador turístico en sector de Qanturaqay (3100m2)
 Acond. plaza artesanal, comercio artesanal y ss.hh. (1470m2)
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2710ml)
 Construcción de pasarela peatonal sobre el río Jatun Mayo
 Reforzam. estructural y restauración de muros prehispánicos
 Acciones de sensibilización con involucrados.
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Ollantaytambo

Distrito : Ollantaytambo

Provincia : Urubamba

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac



Presupuesto :

| | | |
|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado : | S/. | 4,939,020.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado : S/. | | |
| Ppto. Total Costo Directo : | S/. | 725,542.04 |
| Total Costos Indirectos : | S/. | 4,213,477.96 |

| | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | S/. | 44,622.40 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 2,581,635.00 |

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 44,622.40 | 6.15% | 680,919.64 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 680,919.64 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 680,919.64 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 680,919.64 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 680,919.64 |
| 6 | A mayo 2017 | | 0.00% | 16,586.00 | 2.29% | 664,333.64 |
| 7 | A junio 2017 | | 0.00% | 13,752.00 | 1.90% | 650,581.64 |
| 8 | A julio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 650,581.64 |
| 9 | A agosto 2017 | | 0.00% | 12,874.00 | 1.77% | 637,707.64 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 85,944.00 | 11.85% | 551,763.64 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 173,778.40 | 23.95% | 551,763.64 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 2,626,257.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,257.40 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Se debe tener aprobado el expediente tecnico a finales del mes de setiembre

Recomendaciones

Nombre PIP: Mejoramiento de servicios turísticos de observación del paisaje Integral del Cusco - Circuito Valle Sagrado, distritos San Sebastián, Pisac y Huayllabamba, de Las Provincias Cusco, Calca y Urubamba, Departamento de Cusco

Informado al: 30 de setiembre de 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 255893
Prod/Proy : 2250016
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2,017 : 00007
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Corao
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Pisac
 Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Racchi
 Acciones de sensibilización con involucrados
 Acciones de promoción y difusión

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Distrito : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Provincia : Cusco Calca y Urubamba

Presupuesto :

| | | |
|--|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado : | S/. | 2,940,130.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | |
| Ppto. Aprobado : S/. | | |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/. | 431,905.10 |
| Total Costos Indirectos: | S/. | 2,508,224.90 |

| | | |
|--|-----|------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores : | S/. | 0.00 |
| PIM para el año 2017 : | S/. | 811,047.00 |
| <small>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</small> | | |

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | |
| Entrega de Terreno | Acta | |
| Inicio de Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 83,630.00 | 3.33% | 348,275.10 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 348,275.10 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 348,275.10 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 348,275.10 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 348,275.10 |
| 5 | A mayo 2017 | | 0.00% | 18,500.00 | 0.74% | 329,775.10 |
| 6 | A junio 2017 | | 0.00% | 37,000.00 | 1.48% | 292,775.10 |
| 7 | A julio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 292,775.10 |
| 8 | A agosto 2017 | | 0.00% | 12,941.00 | 0.52% | 279,834.10 |
| 8 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 80,000.00 | 3.19% | 199,834.10 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 232,071.00 | 6.06% | 279,834.10 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 811,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,047.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|--|
| Limitaciones Se prevee tener el Exp. Tecnico aprobado a finales del mes de setiembre |
| Recomendaciones |

Nombre PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA KITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO

Informado al: 30 de setiembre 2017

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2012-SNIP
Prod/Proy : 2301167
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00026
Meta Fisica (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad
 Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de
 Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en
 Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Concurso de
 Expediente Técnico

Ubicación:

Localidad :

Distrito :

Provincia :

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/. 5,172,315.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/. 5,172,315.00

Ppto. Total Costo Directo: S/. 4,241,298.30

Total Costos Indirectos: S/. 931,016.70

Ppto. ejecutado años anteriores : 0.00

PIA para el año 2017 : S/. 708,831

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) 0.00



A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| DESCRIPCION | DOCUMENTO | NUMERO | De FECHA |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Aprobación Expediente | Resolución | | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 4 | A marzo 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 5 | A abril 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 6 | A mayo 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 7 | A junio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 8 | A julio 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 9 | A agosto 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| 10 | A setiembre 2017 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,241,298.30 |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 708,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,831.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TIEMPO EJECUCION |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

No existen empresas especializadas en SAT/ Riesgos

Recomendaciones

-Hacer el seguimiento telefonico de las invitaciones directas realizadas via correo electronico al constatare errores en la transmision y recepcion de los correos electronicos

Nombre Programa: "Consolidación y diversificación del producto turístico Cusco - Valle Sagrado de los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la"

Informado al: 30 de setiembre 2017.

A.1 COORDINADOR GRAL (e) Ing. Marco Antonio, Silva Palomino

Fotos de acciones

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : N° **00/00**



A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado **00/00**

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : PROG-016-2012-SNIP
Prod/Proy : 2311404
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00009
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Consolidación de los recursos turísticos

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) es una Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional del Cusco, es decir el PER Plan COPESCO, responsable de conducir y coordinar la implementación y administración del Programa de Inversión "Consolidación y diversificación del producto turístico Cusco - Valle Sagrado de los Incas entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región del Cusco", para lo cual cuenta con la autonomía técnica y financiera.



Valle Sagrado de los Incas

Fuente de Financiamiento :
 Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

| |
|---------------------------------------|
| ESTADO |
| Concurso de Expediente Técnico |

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Distrito : Provincia :

Presupuesto :

| | | | |
|---|------------------|--|---------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : | 18,743,510.23 | Ppto. ejecutado años anteriores : | 0.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. | PIA para el año 2017 : | S/ 18,211,015 |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: | 18,743,510.23 | Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | 0.00 |
| Ppto. Total Costo Directo: | S/ 15,369,678.39 | | |
| Total Costos Indirectos: | S/ 3,373,831.84 | | |

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| Aprobación Expediente | Resolución | | |
| Designación de Residente de obra | Memorándum | | |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución | Resolución(es) | | |
| Designación de Supervisor | Memorándum | | |
| Aprobación Adicionales | Resolución(es) | | |
| Entrega de Terreno | Acta | | |
| Inicio de Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Paralización Temporal del Proyecto | Acta | | |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s) | | |
| Conclusión del Proyecto | Acta | | |

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

| Nro. | Meses | AVANCE FISICO EJECUTADO | | AVANCE FINANCIERO | | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | Presupuesto | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto | Porcentaje | |
| 1 | A diciembre 2016 | | 0.00% | 1,502,149.50 | 9.77% | 13,867,528.89 |
| 2 | A enero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 13,867,528.89 |
| 3 | A febrero 2017 | | 0.00% | | 0.00% | 13,867,528.89 |
| 4 | A marzo 2017 | 3.00 | 0.00% | 354,211.00 | 2.30% | 13,513,317.89 |
| 5 | A abril 2017 | 3.00 | 0.00% | 94,696.00 | 0.62% | 13,418,621.89 |
| 6 | A mayo 2017 | 3.00 | 0.00% | 324,833.50 | 2.11% | 13,093,788.39 |
| 7 | A junio 2017 | 3.00 | 0.00% | 184,387.00 | 1.20% | 12,909,401.39 |
| 8 | A julio 2017 | 3.00 | 0.00% | 173,327.00 | 1.13% | 12,736,074.39 |
| 9 | A agosto 2017 | 3.00 | 0.00% | 5,806.00 | 0.04% | 12,730,268.39 |
| 10 | A setiembre 2017 | 3.00 | 0.00% | 428,443.00 | 2.79% | 12,301,825.39 |
| TOTAL | | 21.00 | 0.00% | 3,067,853.00 | 19.96% | 12,301,825.39 |

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Adiciones Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 18,211,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,211,015.00 |

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF. |
|------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | | | 0 | 0 |
| TIEMPO EJECUCION | | | | | | |

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

| |
|------------------------|
| <u>Limitaciones</u> |
| |
| <u>Recomendaciones</u> |
| |
