

**Nombre PIP:** Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco, Ovalo Liberadores, Puente Costanera Nodo Versalles

**Informado al 30 de JULIO de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. **00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**


**Código SNIP** : 245953  
**Prod/Proy** : 2192979  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00011  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

**Fotos de acciones ejecutadas:**



Longitud total de vía Expresa en la ciudad

Mejoramiento integral de la Vía Expresa, en el tramo Ovalo Los Libertadores, Nodo Versalles, con 6,7 Km. de longitud y 04 vías de 02 carriles cada uno comprende 02 puentes 01 paso a nivel deprimido y 01 viaducto; puentes peatonales, calzadas de asfalto, veredas de concreto.

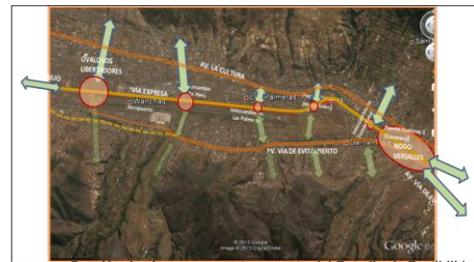

Sección de vía expresa: anteproyecto del Estudio de Factibilidad

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

**Presupuesto :**

|   |     |                |  |     |                |
|---|-----|----------------|--|-----|----------------|
| <b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>         | S/. | 347,244,873.00 | <b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>                     | S/. | 3,593,408.36   |
| <b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>          | S/. |                | <b>PIM para el año 2017 :</b>                                | S/. | 264,901,324.00 |
| <b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado:</b> | S/. | 347,244,873.00 | <b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b> | S/. | 0.00           |
| <b>Ppto. Total Costo Directo:</b>                       | S/. | 221,576,879.80 |  |     |                |
| <b>Total Costos Indirectos:</b>                         | S/. | 125,667,993.20 |  |     |                |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |                    |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Aprobación Expediente               | Resolución     | CONSORCIO CPS-COBA | JUN-JUL-2016 |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |                    |              |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |                    |              |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |                    |              |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |                    |              |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |                    |              |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |                    |              |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                    |              |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |                    |              |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                    |              |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |                    |              |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Avance del Exp. Tecnico).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO   |              | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto         | Porcentaje   |                  |
| 01           | A diciembre 2015 | 0.00                    | 0.00%                  | 368,794.77          | 0.11%        | 346,876,078.23   |
| 02           | A diciembre 2016 | 0.00                    | 0.00%                  | 3,224,613.59        | 0.93%        | 343,651,464.64   |
| 03           | A enero 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%        | 343,651,464.64   |
| 04           | A febrero 2017   | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%        | 343,651,464.64   |
| 05           | A marzo 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 699,820.00          | 0.20%        | 342,951,644.64   |
| 06           | A abril 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%        | 342,951,644.64   |
| 07           | A mayo 2017      | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%        | 342,951,644.64   |
| 08           | A junio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 23,769.00           | 0.01%        | 342,927,875.64   |
| 09           | A julio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 312,590.00          | 0.09%        | 342,615,285.64   |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>4,629,587.36</b> | <b>1.33%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF.   |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 268,494,732.36       | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 268,494,732.36 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION: (Exp. Tecnico)**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240  | 22/04/2016   | 30/11/2016       |           |            | 0          | 240              |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|   |
|---|
| <p><b>Limitaciones</b></p> <p>La empresa encargada de elaborar el Exp. Tecnico, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones del Exp. Tecnico con demora.</p>  |
| <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>Se prevee tener Exp. Tecnico aprobado la quincena del mes de Agosto 2017, debido a que la empresa Consultora no cumple oportunamente en levantar observaciones. Se curso carta notarial para el cumplimiento de la entrega del Exp. Tecnico.</p> |

**Nombre PIP: Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Pisac distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento del Cusco**

**Informado al: 30 de Julio de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:


**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 255602  
**Prod/Proy** : 2250007  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00006  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento acceso vehicular al S.A. Pumamarca (3.30 km)  
 Construcción del parador turístico en Pumamarca (200m2)  
 Implementación de señalización turística integral (30 unid.)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2510ml)  
 Restauración de andenerías en Pumamarca  
 Acciones de sensibilización e involucramiento  
 Acciones de capacitación y monitoreo a emprendedores  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac



Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad :  Distrito :  Provincia :

**Presupuesto :**

|   |     |               |   |     |               |
|---|-----|---------------|---|-----|---------------|
| Ppto. Aprobado :                        | S/. | 38,544,367.00 | Ppto. ejecutado años anteriores :                     | S/. | 0.00          |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. |               | PIM para el año 2017 :                                | S/. | 14,463,462.00 |
| Ppto. Aprobado : S/.                    |     |               | Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) |     |               |
| Ppto. Total Costo Directo:              | S/. | 31,907,199.60 |   |     |               |
| Total Costos Indirectos:                | S/. | 6,637,167.40  |   |     |               |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |              | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje   |                  |
| 1            | A diciembre 2015 |                         | 0.00%                  | 846,517.00        | 2.65%        | 31,060,682.60    |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 5,804.80          | 0.02%        | 31,054,877.80    |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 6            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 7            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| 8            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 31,054,877.80    |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>852,321.80</b> | <b>0.02%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF.  |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 14,463,462.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 14,463,462.00 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Dias | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|  |
|--|
| <b>Limitaciones</b><br>Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras |
| <b>Recomendaciones</b><br>Se remite documentación al Banco Mundial informando sobre problemas en el proceso de licitación de expediente tecnico                  |

**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición final para el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba - Región Cusco .


**Informado al:** 30 de Julio de 2017.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237756  
**Prod/Proy** : 2197999  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2016** : 00003  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Jahuacollay Distrito : Urubamba Provincia : Urubamba

**Presupuesto :**

|  |     |              |   |     |               |
|--|-----|--------------|---|-----|---------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :         | S/. | 8,680,363.00 | Ppto. ejecutado años anteriores :                     | S/. | 69,616.76     |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :          | S/. |              | PIM para el año 2017                                  |     | 12,469,984.00 |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: | S/. |              | Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) |     |               |
| Ppto. Total Costo Directo:                       | S/. | 7,395,637.00 |   |     |               |
| Total Costos Indirectos:                         | S/. | 1,284,726.00 |   |     |               |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |                              |            |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Aprobación Expediente               | Resolución     | RES.DIR. 0325.DE.COPESCO/GRC | 25/11/2016 |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |                              |            |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |                              |            |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |                              |            |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |                              |            |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |                              |            |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |                              |            |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                              |            |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |                              |            |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                              |            |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |                              |            |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO   |               | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto         | Porcentaje    |                  |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 69,616.76           | 0.94%         | 7,326,020.24     |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 7,326,020.24     |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 7,326,020.24     |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  | 15,100.00           | 0.20%         | 7,310,920.24     |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  | 221,500.00          | 3.00%         | 7,089,420.24     |
| 6            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 9,741.00            | 0.13%         | 7,079,679.24     |
| 7            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 7,079,679.24     |
| 8            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 1,022,350.00        | 13.82%        | 6,057,329.24     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>1,338,307.76</b> | <b>18.10%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF.  |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 12,539,600.76        | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 12,539,600.76 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240  | 01/07/2017   | 30/03/2018       |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|   |
|---|
| <b>Limitaciones</b><br>Esta pendiente la firma de contrato para su ejecución, se prevee el inicio para el mes de agosto |
| <b>Recomendaciones</b>  |



**Nombre PIP:** Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Taray de la provincia de Calca- Región Cusco.

**Informado al:** 30 de julio de 2017.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Último Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : 237591  
**Prod/Proy** : 2197998  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00002  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.  
 Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS  
 Apropiado reaprovechamiento de RRSS  
 Apropiada disposición final de los RRSS  
 Eficiente gestión administrativa y financiera  
 Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

**ESTADO**  
**Expediente Técnico**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Yanahuaylla Distrito : Calca Provincia : Calca



Foto de pasantías Kimbiri fecha:24 al 27 noviembre 2015

**Presupuesto :**

|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :             | S/. | 6,611,849.00 | Ppto. ejecutado años anteriores :                     | S/. | 597,193.65   |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :              | S/. |              | PIM para el año 2017 :                                | S/. | 5,649,461.00 |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/. |     |              | Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) |     |              |
| Ppto. Total Costo Directo:                           | S/. | 5,924,822.00 |   |     |              |
| Total Costos Indirectos:                             | S/. | 687,027.00   |   |     |              |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |                             |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Aprobación Expediente               | Resolución     | CONSORCIO GEOCONSUL-GETINSA | 30/06/2017 |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |                             |            |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |                             |            |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |                             |            |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |                             |            |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |                             |            |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |                             |            |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                             |            |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |                             |            |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |                             |            |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |                             |            |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Exp. Técnico)**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO   |               | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto         | Porcentaje    |                  |
| 01           | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 597,193.65          | 10.08%        | 5,327,628.35     |
| 02           | A enero 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 5,327,628.35     |
| 03           | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 5,327,628.35     |
| 04           | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  | 15,100.00           | 0.25%         | 5,312,528.35     |
| 05           | A abril 2017     |                         | 0.00%                  | 177,400.00          | 2.99%         | 5,135,128.35     |
| 06           | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 149,541.00          | 2.52%         | 4,985,587.35     |
| 07           | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 4,985,587.35     |
| 08           | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 1,213,600.00        | 20.48%        | 3,771,987.35     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>2,152,834.65</b> | <b>36.34%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 6,246,654.65         | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 6,246,654.65 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 240  | 01/09/2017   | 30/05/2018       |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|   |
|---|
| <b>Limitaciones</b><br>El expediente técnico se encuentra para registro de verificación de viabilidad y luego con informe para aprobación de expediente |
| <b>Recomendaciones</b><br><br>- Se recomienda agilizar el proceso de aprobación de expediente.  |

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro histórico v

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00014  
**Meta Fisica (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de implementado el Plan de Movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Cusco.

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :         | S/. | 9,735,000.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :          | S/. |              |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: | S/. | 9,735,000.00 |
| Ppto. Total Costo Directo:                       | S/. | 7,982,700.00 |
| Total Costos Indirectos:                         | S/. | 1,752,300.00 |

|   |            |
|---|------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores :                     | 741,464.22 |
| PIM para el año 2017 :                                | 2,785,307  |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | 0.00       |



Plan de movilidad orientado al peatón

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |               | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje    |                  |
| 01           | A diciembre 2016 | 0.00                    | 0.00%                  | 741,464.22        | 9.29%         | 7,241,235.78     |
| 02           | A enero 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%         | 7,241,235.78     |
| 03           | A febrero 2017   | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%         | 7,241,235.78     |
| 04           | A marzo 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 34,840.00         | 0.44%         | 7,206,395.78     |
| 05           | A abril 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 8,500.00          | 0.11%         | 7,197,895.78     |
| 06           | A mayo 2017      | 0.00                    | 0.00%                  | 48,325.00         | 0.61%         | 7,149,570.78     |
| 07           | A junio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 8,530.00          | 0.11%         | 7,141,040.78     |
| 08           | A julio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 4,400.11          | 0.06%         | 7,136,640.67     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>846,059.33</b> | <b>10.60%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 3,526,771.22         | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 3,526,771.22 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

**Limitaciones**  
Incumplimiento de plazos contractuales por parte de los consultores que genera retraso en la programación

**Recomendaciones**  
Monitoreo permanente hacia los consultores para el cumplimiento de lo establecido según cronograma

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Seguridad Vial en el centro historico v

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00013  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer a la Gerencia de Infraestructura de la MP Cusco en temas de gestión vial, así como; fortalecer las capacidades del PROGRAMA METRA – COPESCO y de la MP Cusco.

**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

**ESTADO**

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**EN EJECUCION DE COMPONENTES**

**Ubicación:**

Localidad :

Cusco

Distrito :

Cusco, Wanchaq, San Sebastián

Provincia :

Cusco

**Presupuesto :**

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/.

S/.

9,904,278.00

Ppto. ejecutado años anteriores :

0.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

S/.

9,904,278.00

PIM para el año 2017 :

S/.

3,067,612

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.

S/.

9,904,278.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

0.00

Ppto. Total Costo Directo: S/.

S/.

8,121,507.96

Total Costos Indirectos: S/.

S/.

1,782,770.04



Plan de movilidad orientado al peatón

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO   |               | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto         | Porcentaje    |                  |
| 01           | A diciembre 2016 | 0.00                    | 0.00%                  | 1,593,608.75        | 19.62%        | 6,527,899.21     |
| 02           | A enero 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 0.00                | 0.00%         | 6,527,899.21     |
| 03           | A febrero 2017   | 0.00                    | 0.00%                  | 8,809.12            | 0.11%         | 6,519,090.09     |
| 04           | A marzo 2017     | 3.00                    | 0.00%                  | 332,009.57          | 4.09%         | 6,187,080.52     |
| 05           | A abril 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 126,050.45          | 1.55%         | 6,061,030.07     |
| 06           | A mayo 2017      | 0.00                    | 0.00%                  | 182,014.60          | 2.24%         | 5,879,015.47     |
| 07           | A junio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 204,171.05          | 2.51%         | 5,674,844.42     |
| 07           | A julio 2017     | 0.00                    | 0.00%                  | 172,166.67          | 2.12%         | 5,502,677.75     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>3.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>2,618,830.21</b> | <b>32.25%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 3,067,612.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 3,067,612.00 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Dias | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2013-SNIP  
**Prod/Proy** : 2309562  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00012  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

El objetivo de este componente es de fortalecer la capacidad de gestión e implementado el Plan Regulador del Transporte Público en la ciudad de Cusco. Fomentado el uso de bicicletas en la ciudad de Cusco.

Seguridad Vial en el centro historico



**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos Determinados

ESTADO

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

EN EJECUCION DE COMPONENTES

**Ubicación:**

Localidad : Cusco

Distrito : Cusco, Wanchaq, San Sebastij

Plan de movilidad orientado al peatón

Provincia : Cusco

**Presupuesto :**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :          | S/. | 5,599,000.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :           | S/. |              |
| Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado : | S/. | 5,599,000.00 |
| Ppto. Total Costo Directo:                        | S/. | 4,591,180.00 |
| Total Costos Indirectos:                          | S/. | 1,007,820.00 |

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Ppto. ejecutado años anteriores :                     | 0.00 |           |
| PIM para el año 2017 :                                | S/.  | 2,292,896 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) | 0.00 |           |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |              | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje   |                  |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 316,701.03        | 6.90%        | 4,274,478.97     |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 4,274,478.97     |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 4,274,478.97     |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  | 20,000.00         | 0.00%        | 4,254,478.97     |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  | 10,000.00         | 0.22%        | 4,244,478.97     |
| 6            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 10,000.00         | 0.22%        | 4,234,478.97     |
| 7            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 10,000.00         | 0.22%        | 4,224,478.97     |
| 8            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 45,946.00         | 1.00%        | 4,178,532.97     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>412,647.03</b> | <b>8.55%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 2,292,896.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 2,292,896.00 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|   |
|---|
| <u>Limitaciones</u>   |
| Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras. |
| <u>Recomendaciones</u>  |

**Nombre PIP:** "CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RÁPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO"

**Informado al: 30 de Julio 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. **00/00**

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: **00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

**Código SNIP** : PROG-016-2012-SNIP  
**Prod/Proy** : 2301167  
**Unidad Ejecutora** : PER PLAN COPESCO  
**Meta SIAF del 2017** : 00025  
**Meta Física (resumen)** : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



El PIP Patacancha tiene los siguientes componentes:

Equipamiento para SAT del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Mayor capacidad de identificación de puntos críticos e instalación de Instrumentos de Suficientes equipos y medios de comunicación para la alerta y alarma oportuna en Mejoramiento de la capacidad de respuesta de las autoridades y población de

**Modalidad de Ejecución :**

Concurso de Expediente Técnico

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : **PATACANCHA** Distrito : **OLLANTAYTAMBO** Provincia : **URUBAMBA**

**Presupuesto :**

|  |     |              |  |      |         |
|--|-----|--------------|--|------|---------|
| <b>Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :</b>          | S/. | 4,662,794.00 | <b>Ppto. ejecutado años anteriores :</b>                     | 0.00 |         |
| <b>Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :</b>           | S/. |              | <b>PIA para el año 2017 :</b>                                | S/.  | 368,601 |
| <b>Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado :</b> | S/. | 4,662,794.00 | <b>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</b> | 0.00 |         |
| <b>Ppto. Total Costo Directo :</b>                       | S/. | 3,823,491.08 |  |      |         |
| <b>Total Costos Indirectos :</b>                         | S/. | 839,302.92   |  |      |         |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

| DESCRIPCION                         | DOCUMENTO      | NUMERO | De FECHA |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |        |          |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |        |          |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |        |          |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |        |          |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |        |          |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |        |          |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |        |          |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |        |          |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |        |          |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |        |          |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |        |          |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |              | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje   |                  |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 6            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 7            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| 8            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 3,823,491.08     |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 368,601.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 368,601.00   |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

| Limitaciones  |
|---|
| Se encuentra en proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico            |
| Recomendaciones   |
| - Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos para elaborar el Exp. Técnico. |

**Nombre PIP: Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del monumento arqueológico de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.**

**Informado al: 30 de Julio de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

**A.2 SUPERVISOR**

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**

Código SNIP : 260407  
 Prod/Proy : 2250100  
 Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO  
 Meta SIAF del 2017 : 00008  
 Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Fotos de acciones ejecutadas:



Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písac (7.60 km)  
 Construcción Centro de Interpretación del P.A. Písac. (400m2)  
 Implementación de señalización turística integral (70 unid.)  
 Const. de parador turístico en sector de Qanturaqay (3100m2)  
 Acond. plaza artesanal, comercio artesanal y ss.hh. (1470m2)  
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2710ml)  
 Construcción de pasarela peatonal sobre el río Jatun Mayo  
 Reforzam. estructural y restauración de muros prehispánicos  
 Acciones de sensibilización con involucrados.  
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico



**Fuente de Financiamiento :**

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

ESTADO

Expediente Técnico

**Modalidad de Ejecución :**

Por contrato

**Ubicación:**

Localidad : Ollantaytambo

Distrito : Ollantaytambo

Provincia : Urubamba

Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Písac

**Presupuesto :**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Ppto. Aprobado :                        | S/. | 4,939,020.00 |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. |              |
| Ppto. Aprobado : S/.                    |     |              |
| Ppto. Total Costo Directo:              | S/. | 725,542.04   |
| Total Costos Indirectos:                | S/. | 4,213,477.96 |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Ppto. ejecutado años anteriores :                     | S/. | 44,622.40    |
| PIM para el año 2017 :                                | S/. | 2,581,635.00 |
| Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero) |     |              |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |               | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje    |                  |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 44,622.40         | 6.15%         | 680,919.64       |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%         | 680,919.64       |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%         | 680,919.64       |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%         | 680,919.64       |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%         | 680,919.64       |
| 6            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 16,586.00         | 2.29%         | 664,333.64       |
| 7            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 13,752.00         | 1.90%         | 650,581.64       |
| 7            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%         | 650,581.64       |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>74,960.40</b>  | <b>10.33%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)**

| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 2,626,257.40         | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 2,626,257.40 |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

Limitaciones

Esta pendiente la entrega del Expediente Tecnico para la ejecucion del PIP

Recomendaciones

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

**Nombre PIP: Mejoramiento de servicios turísticos de observación del paisaje integral del Cusco - Circuito Valle Sagrado, distritos San Sebastián, Pisac y Huayllabamba, de Las Provincias Cusco, Calca y Urubamba, Departamento de Cusco**

**Informado al: 30 de julio de 2017.**

**A.1 COORDINADOR GRAL ( e )** Ing. Cesar Jimenez Manrique  
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

**00/00**

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

**A.2 SUPERVISOR**  
Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

**00/00**

**A.3 DATOS DEL PROYECTO :**  
Código SNIP : 255893  
Prod/Proy : 2250016  
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO  
Meta SIAF del 2,017 : 00007  
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Corao  
Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Pisac  
Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Racchi  
Acciones de sensibilización con involucrados  
Acciones de promoción y difusión



Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

**Fuente de Financiamiento :**  
Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

|                    |
|--------------------|
| <b>ESTADO</b>      |
| Expediente Técnico |

**Modalidad de Ejecución :**  
Por contrato

**Ubicación:**  
Localidad : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Distrito : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba. Provincia : Cusco Calca y Urubamba

|   |     |              |  |     |            |
|---|-----|--------------|--|-----|------------|
| <b>Presupuesto :</b>                    |     |              |  |     |            |
| Ppto. Aprobado :                        | S/. | 2,940,130.00 | Ppto. ejecutado años anteriores :                                    | S/. | 0.00       |
| Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : | S/. |              | PIM para el año 2017 :   | S/. | 811,047.00 |
| Ppto. Aprobado :                        | S/. |              | <small>Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)</small> |     |            |
| Ppto. Total Costo Directo :             | S/. | 431,905.10   |  |     |            |
| Total Costos Indirectos :               | S/. | 2,508,224.90 |  |     |            |

**A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

|                                     |                |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| Aprobación Expediente               | Resolución     |  |  |
| Designación de Residente de obra    | Memorándum     |  |  |
| Prorroga en el Plazo de Ejecución   | Resolución(es) |  |  |
| Designación de Supervisor           | Memorándum     |  |  |
| Aprobación Adicionales              | Resolución(es) |  |  |
| Entrega de Terreno                  | Acta           |  |  |
| Inicio de Proyecto                  | Acta           |  |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |  |
| Paralización Temporal del Proyecto  | Acta           |  |  |
| Paralización de Proyecto / Reinicio | Acta(s)        |  |  |
| Conclusión del Proyecto             | Acta           |  |  |

**A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).**

| Nro.         | Meses            | AVANCE FISICO EJECUTADO |                        | AVANCE FINANCIERO |              | SALDO Financiero |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|
|              |                  | Presupuesto             | Porcentaje c/r al C.D. | Presupuesto       | Porcentaje   |                  |
| 1            | A diciembre 2016 |                         | 0.00%                  | 83,630.00         | 3.33%        | 348,275.10       |
| 2            | A enero 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 348,275.10       |
| 3            | A febrero 2017   |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 348,275.10       |
| 4            | A marzo 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 348,275.10       |
| 5            | A abril 2017     |                         | 0.00%                  |                   | 0.00%        | 348,275.10       |
| 5            | A mayo 2017      |                         | 0.00%                  | 18,500.00         | 0.74%        | 329,775.10       |
| 6            | A junio 2017     |                         | 0.00%                  | 37,000.00         | 1.48%        | 292,775.10       |
| 7            | A julio 2017     |                         | 0.00%                  | 0.00              | 0.00%        | 292,775.10       |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>           | <b>139,130.00</b> | <b>5.55%</b> | <b>0.00</b>      |

**A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones**

|                      |               |                  |                               |            |              |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| Aporte Gob. Regional | Otros Aportes | Mayores Metrados | Partidas Nuevas / Adicionales | Deductivos | TOTAL MODIF. |
| 811,047.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00                          | 0.00       | 811,047.00   |

**A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:**

| Días | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | EJECUTADO | PARALIZADO | AMPLIACIÓN | TOTAL MODIF.     |
|------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|      |              |                  |           |            | 0          | 0                |
|      |              |                  |           |            |            | TIEMPO EJECUCION |

**A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:**

|   |
|---|
| <u>Limitaciones</u><br>Se prevee tener el Exp. Técnico aprobado a finales del mes de agosto |
| <u>Recomendaciones</u>  |



